



# Verkeersplan baggeren Zaanstad

## Project: Baggeren drie locaties in Zaanstad

**Opdrachtgever** : Gemeente Zaanstad  
Postbus 2000  
1500 GA Zaandam

**Uitvoerende** : J.P. Schilder B.V.  
Noorddijkerweg 66b  
1645 VG Ursem

**Projectnummer** : B505 / 30-2020

**Versie** : 1

**Datum** : 14 januari 2021

## Inhoud

Verkeersplan baggeren Zaanstad .....	1
Locatie 1 – Overtoom .....	3
Locatie 2 – Ouwelkade .....	4
Locatie 3 – Zaanlandsche Zeilvereniging (Pieter Kuiperlaan, Westknollendam) .....	6

## Inleiding

J.P. Schilder bv gaat baggerwerkzaamheden uitvoeren in Zaandam. In totaal zal bij het ‘baggeren drie locaties in Zaandam” circa 10.370 m3 baggerspecie vrijkomen.

J.P. Schilder B.V. verzorgt alle benodigde toestemmingen, ontheffingen meldingen etc. voor het toepassen van alle overslagvoorzieningen. In dit verkeersplan zijn de opstellocaties en verkeersmaatregelen beschreven. De afzettingen zijn conform CROW 96b en staan aangegeven bij de toestemmingen en vergunningen. Vanuit de opstellocaties wordt met borden het overige verkeer gewaarschuwd (J16, A01-30 en J37 + o.b. in / uitrit werkverkeer). De verkeersvoorzieningen worden getroffen bij de opstellocaties. In overleg met de betreffende beheerders worden de nodige maatregelen genomen voor een veilige afwikkeling van het werkverkeer en de aan- en afvoer materieel. In de bijlage zijn de verkeersplannen per locatie toegevoegd.


### Vooropname

Van de opstellocaties wordt voordat wij starten een 0-inspectie gedaan van de weg/trottoir. De overslaglocaties worden hieronder nader omschreven.

## Locatie 1 – Overtoom

Overslaglocatie 1 is op de parkeerplaats ter hoogte van de veldweg/overtoom (zie onderstaande afbeelding voor de exacte locatie en aanrijdroute). Hier is voldoende ruimte beschikbaar en wordt de openbare weg niet gebruikt. Verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b en weergegeven in de bijlage. Bij de opstellocatie worden draglineschotten en rijplaten gebruikt ter bescherming van de ondergrond. Ook wordt er een deel via het water afgevoerd, zie overslaglocatie 2 op onderstaande afbeelding.


De werkzaamheden staan gepland in week 13 en 14 van 2021. Op één werkdag wordt ongeveer 8x een vrachtwagen geladen.

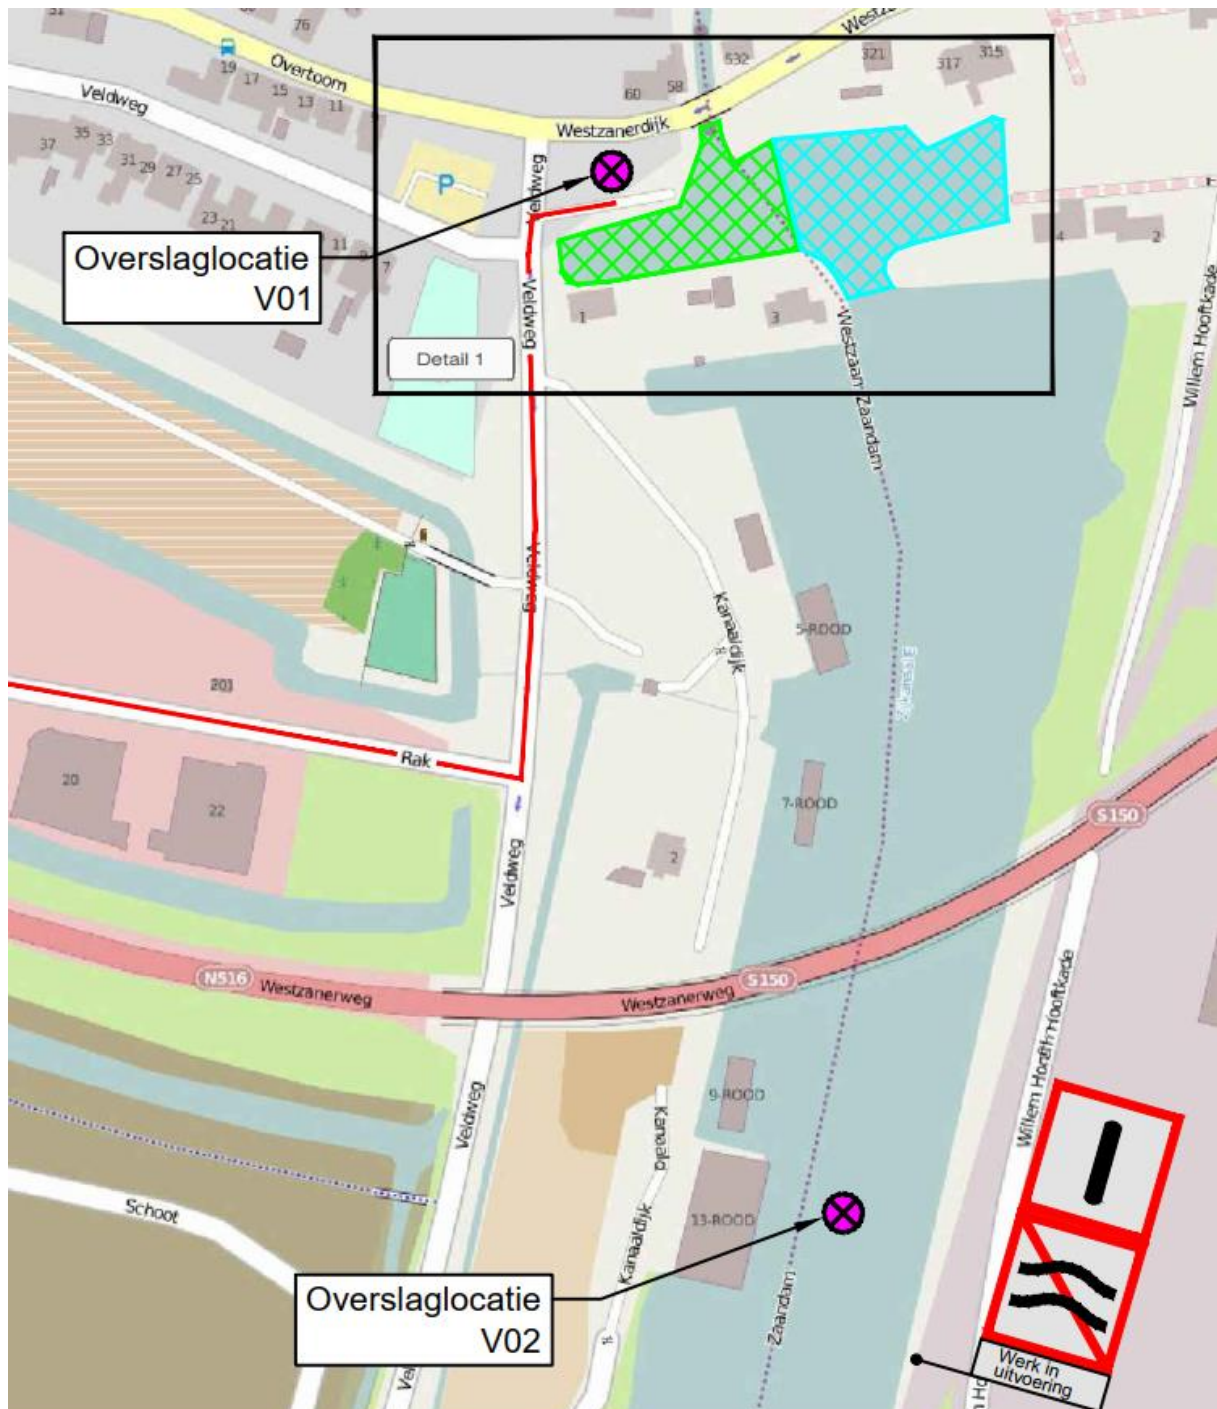


## Locatie 2 – Ouwelkade

Een deel van de baggerspecie locatie Ouwelkade wordt overgeslagen op de brug 'slager rak'. De brug wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten, het verkeer wordt tijdelijk omgeleid. Verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b en weergegeven in de bijlage. Bij de opstellocatie worden draglineschotten en rijplaten gebruikt ter bescherming van de ondergrond. Ook wordt er een deel via het water afgevoerd

De werkzaamheden staan gepland in week 12 van 2021. Op één werkdag wordt ongeveer 8x een vrachtwagen geladen.

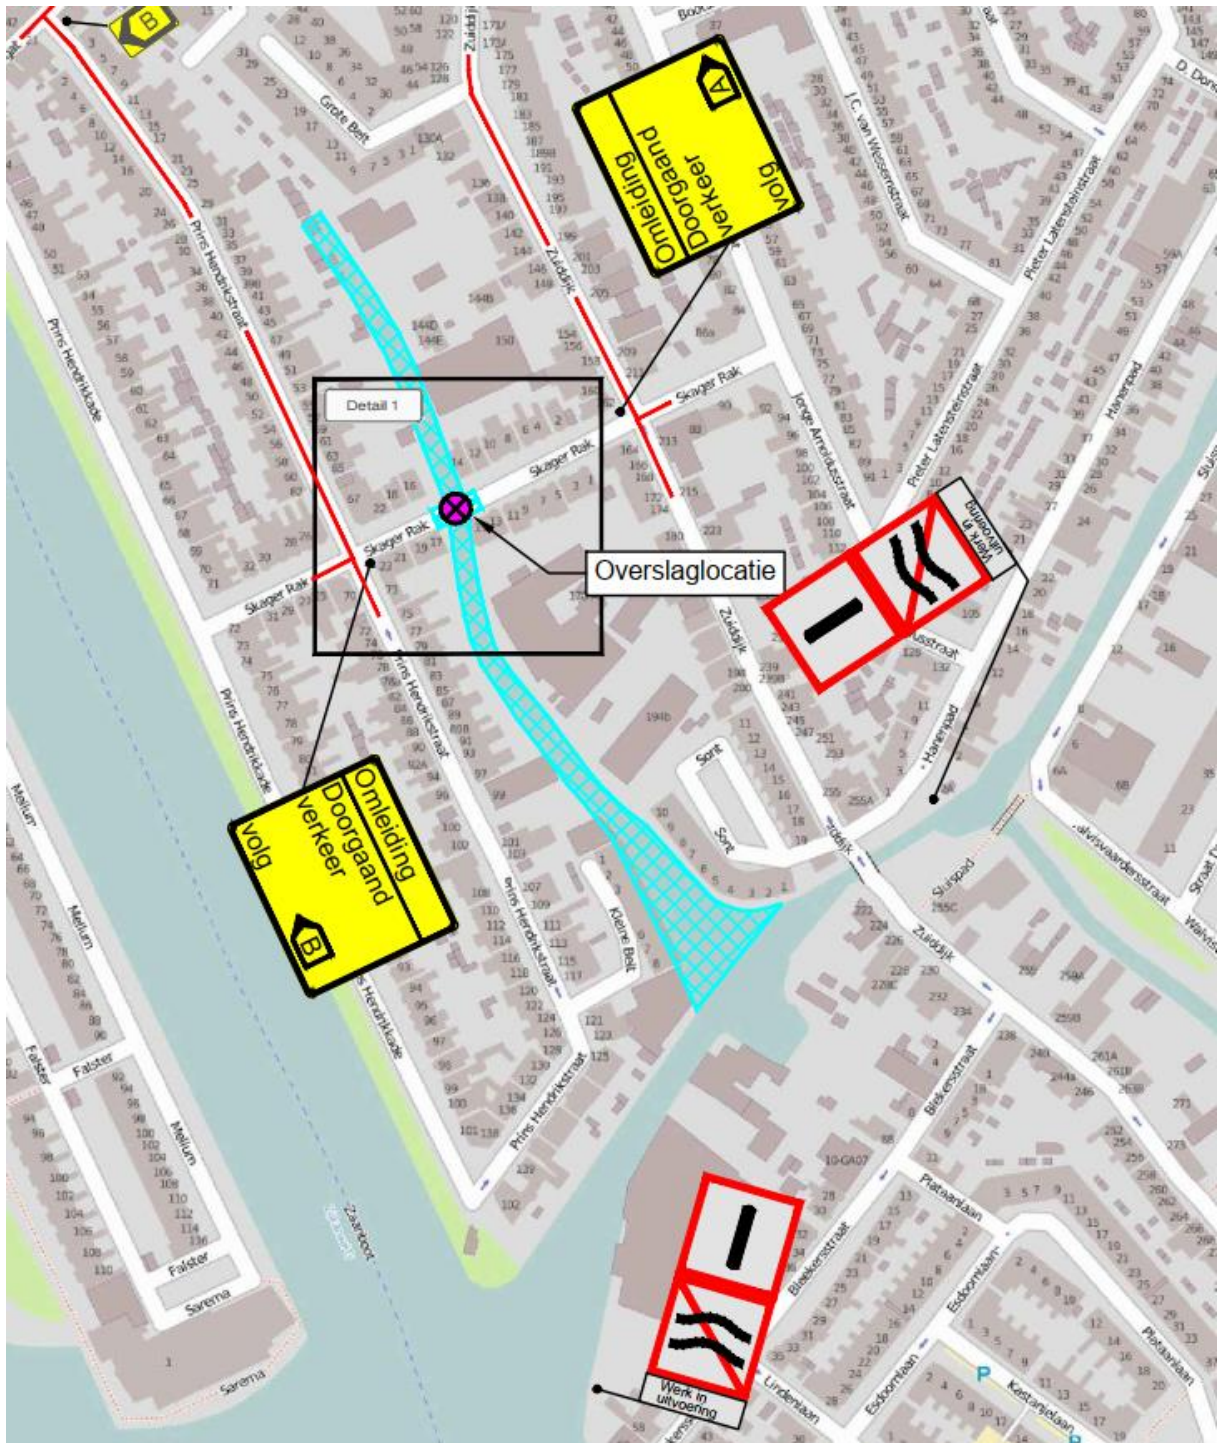

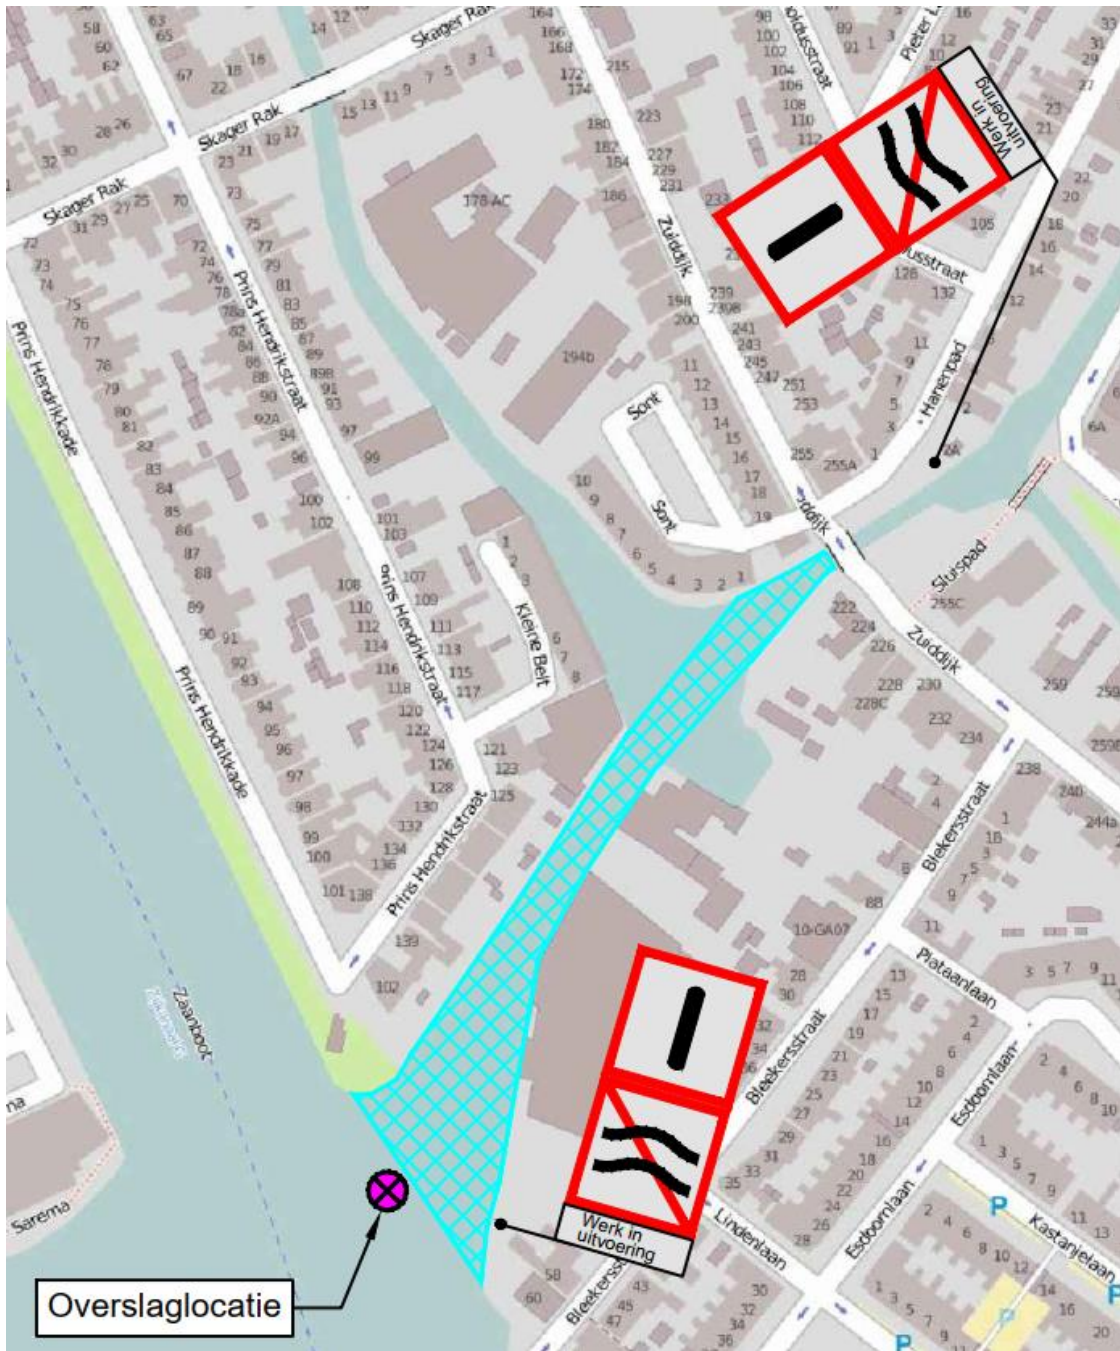

### Locatie 3 – Zaanlandsche Zeilvereniging (Pieter Kuiperlaan, Westknollendam)

Bij de Zaanlandsche Zeilvereniging wordt de baggerspecie op het water overgeslagen en afgevoerd, zie onderstaande afbeelding voor de exacte locatie. De werkzaamheden staan gepland in week 8 t/m 11 van 2021.

